

OVERBLIK

Jf. orientering fra Dræn- og Klimasikringslauget til generalforsamlingen 5. maj 2024 deler vi vores drænsystem op i 3 områder (se vedlagte kort)

Område 1 Mosevangen-Lundevangen

Område 2 Mosevangen og

Område 3 Tinkerupvej-Åvangen

AKTIVITET I SIDEN SIDSTE GENERALFORSAMLING 5.MAJ 2024

Da Dræn- og Klimasikringslauget har begrænsede økonomiske ressourcer, har vi koncentreret os om at få drænet område 3 (Tinkerupvej) i orden. De øvrige områder har vi desværre ikke taget fat på endnu af økonomiske årsager.

I slutningen af januar 2024 var der bl.a. oversvømmelser i området ved Tinkerupvej 27 rapporteret af Carl Ejler. (område 3) og ved Mosevangen 24 (område 1) rapporteret af Lars Lillelund.

På baggrund af oversvømmelse ved Tinkerupvej 27 blev der igangsat en spuling af dræn i marts 2024, som afslørede et sammenfald af drænet på grunden Tinkerupvej 31. Drænet blev repareret på grunden Tinkerupvej 31 i april 2024.

Samtidig blev drænet spulet og undersøgt fra grøften ved Revlingestien og op til brønden ved Tinkerupvej 23 (ca midt på strækningen). Fra drænbrønden Tinkerupvej 23 og til grøften ved Revlingestien og ud i Tinkerup Å var der gennemløb.

Resten af drænet fra Tinkerupvej 23 til betonbrønden ved Åvangen 2/Revlingestien blev ikke undersøgt.

13.05.2024 fik vi en henvendelse fra Gribskov Kommune vedr. manglende dræning og afvanding fra den store betonbrønd ved Revlingestien/Åvangen 2 bla. på baggrund af klager fra grundejere på den anden side af Revlingestien hvor deres dræn afvander ind i vores dræn. Vandet stod højt i betonbrønden helt op til dækslet og det var tydeligt at der "ikke var hul igennem"

Da vi ifølge Vandløbsloven er forpligtede til at holde vores dræn vedlige, gik vi i gang med at spule og undersøge drænet fra Tinkerupvej og op til brønden ved Revlingestien/Åvangen 2.

Det viste sig, at det ikke var muligt, da der kun kan spules/undersøges, hvis der er højst ca. 100 m mellem drænbrøndene. Strækningen op til brønden var for lang, så det var ikke muligt at undersøge drænledningen fra brønden ved Tinkerupvej 23 op til brønden ved Revlingestien/Åvangen 2.

I efteråret blev der derfor iværksat isætning af en drænbrønd på drænledningen på grunden Tinkerupvej 19.

Det viste sig dog, at det ikke var muligt at finde drænledningen fra Åvangen og ned til Tinkerupvej 19 på trods af opgravning flere steder på grunden nr 19.

For at undgå yderligere kraftige opgravninger på grundene uden sikkerhed for, at vi kunne finde drænledningen, besluttede bestyrelsen at lægge en ny drænledning fra Tinkerupvej 23 til Åvangen 1.

Den nye drænledning er vist på As Build tegningen sidst i orienteringen her.

På grund af myndighedsansøgning, hvor der først fremkom tilladelse 21. januar og på grund af vejrliget blev arbejdet med at etablere den nye drænledning først startet 10. marts 2025.

Arbejdet har desværre budt på en del udfordringer. For at få et rigtigt fald på drænet skulle der graves op til 3 m ned under terræn ved krydset Åvangen/Tinkerupvej.

Drænet er nu lagt og færdigt, og ødelagt asfalt og rabatter er retableret.

Det sidste stykke af drænet fra Åvangen 1 og til betonbrønden ved Åvangen 2/Revlingestien har ikke været omfattet af arbejdet, og drænet på det sidste stykke er også i dårlig stand, selv om der nu er gennemløb således, at vandet i betonbrønden Åvangen 2/Revlingestien ikke længere står højt.

Den sidste strækning kan dog hurtig lukke til da den dårlige tilstand af drænet betyder, at det let bliver stoppet. Jord løber ind i ledningen da den er brudt flere steder. Der gror også rødder ind i ledningen.

PLANLAGT AKTIVITET FREM TIL NÆSTE GENERALFORSAMLING MAJ 2026

På grund af den store omkostning og det store arbejde med drænledningen ved Tinkerupvej vil der ikke være råd til store arbejder i 2025.

Dog vil vi se, om vi kan få den sidste strækning fra betonbrønden Åvangen 2/Revlingestien udskiftet. På grund af, at ledningen skal gå under vejen og på grund af, at der skal etableres vejbrønde på strækningen, er det dyrt at få lavet (vi har tilbud på 86.000 kr. inkl. moms)

Vi vil også begynde at arbejde med område 1 Mosevangen-Lundevangen, herunder afløb fra søen ved Lundevangen og ud i Kattegat. Der skulle være afløb, jf. kommunens drænkort.

Både drænet fra område 1 Mosevangen-Lundevangen og område 2 Mosevangen er afhængige af, at der er god afvanding fra Tinkerup Å, herunder at der også er afløb fra søen bag grundene ved Lundevangen for enden af Tinkerup Å til Kattegat

For et overblik over de forskellige områder henvises til drænkort vedlagt denne orientering.

Frank Slemming


Steen Bolbro

Klaus Hoffmann-Petersen

Dræn og Klimasikringslauget

Tinkerup Grundejerforening

For et overblik over de forskellige områder henvises til drænkort herunder.

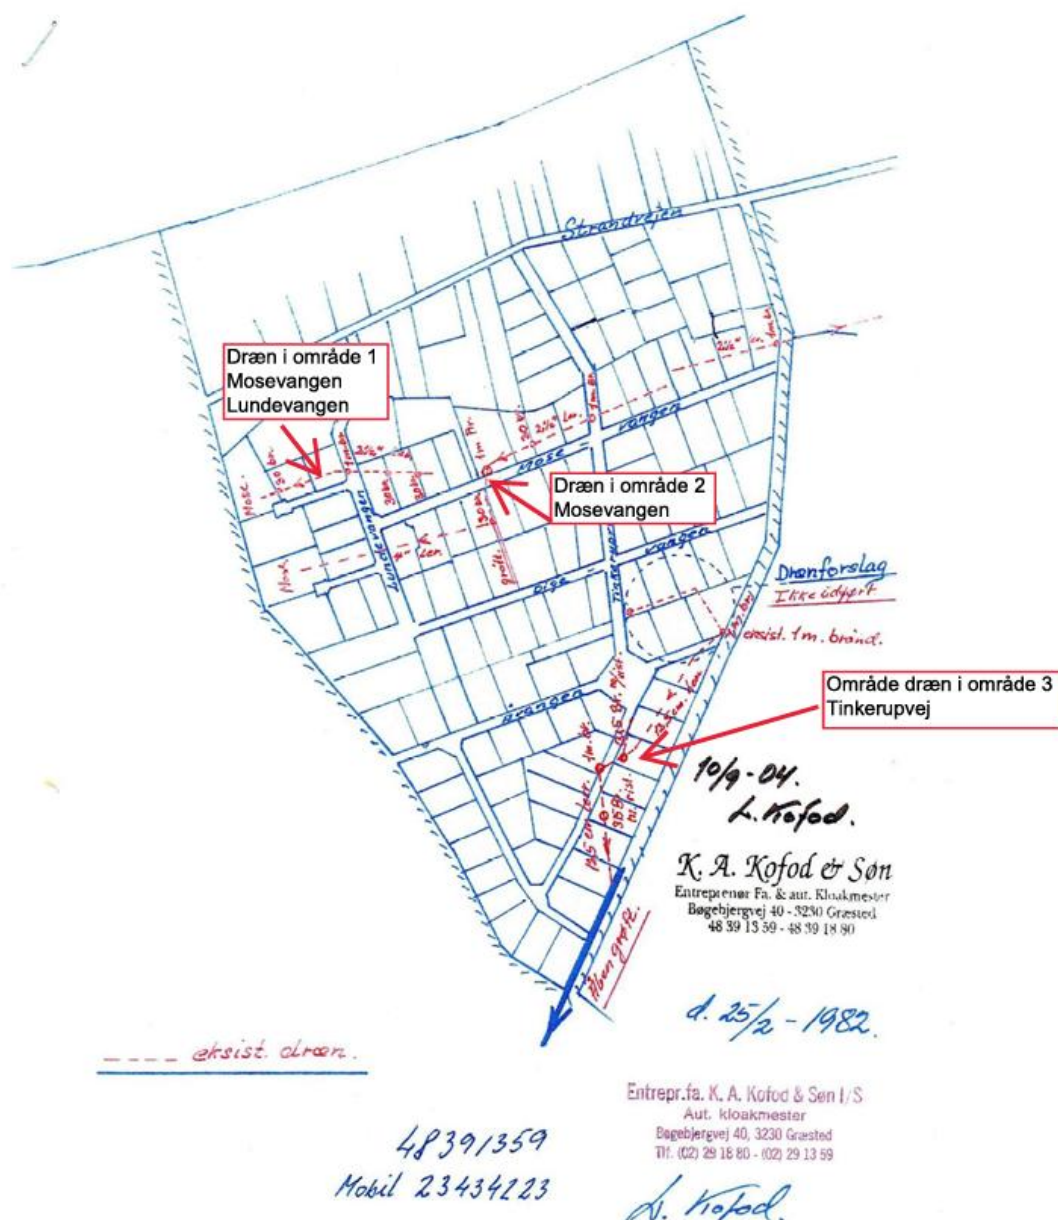

Skitse ny drænledning fra drænbrønd Åvangen 1 til drænbrønd Tinkerupvej 23

Bilag Orientering Drænlaug TGF Generalforsamling 11.05.2025



Drænledning som ikke kunne findes —

Ny drænledning som er etableret —

Eksisterende drænledning - - - - -

● = Drænbrønd
